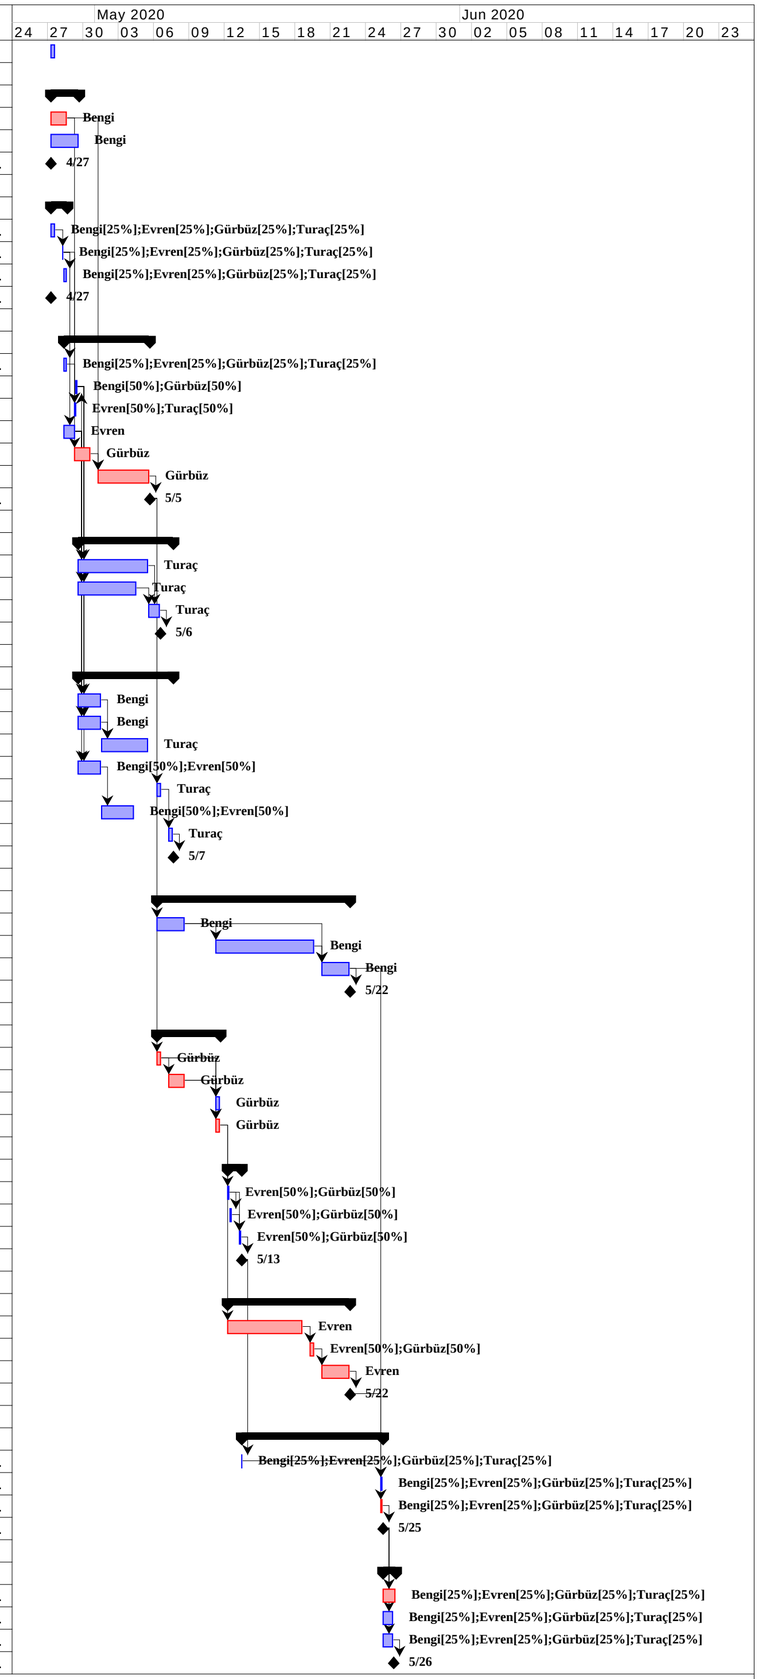		Name	Duration	Start	Finish	Predece...	Resource Names
1		City App	1 day?	4/27/20 8:00 AM	4/27/20 5:00 PM		
3		**Repository Initialization**	**3 days?**	**4/27/20 8:00 AM**	**4/29/20 5:00 PM**		
4		Django Repo Initialization	2 days?	4/27/20 8:00 AM	4/28/20 5:00 PM		Bengi
5		Wiki page structure	3 days	4/27/20 8:00 AM	4/29/20 5:00 PM		Bengi
6		Repo ready for development and documenta...	0 days?	4/27/20 8:00 AM	4/27/20 8:00 AM		Bengi[25%];Evren[25%];Turaç[25%];Gürbüz[2...
8		**Requirements elicitation**	**2 days?**	**4/27/20 8:00 AM**	**4/28/20 5:00 PM**		
9		Requirements brainstorming & question	1 day	4/27/20 8:00 AM	4/27/20 5:00 PM		Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
10		Customer feedback meeting	0.25 days	4/28/20 8:00 AM	4/28/20 10:00 AM	9	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
11		Requirements update	0.75 days	4/28/20 10:00 AM	4/28/20 5:00 PM	10	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
12		Requirements documented on wiki	0 days?	4/27/20 8:00 AM	4/27/20 8:00 AM		Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
14		**System Design & Infrastructure**	**5.75 days?**	**4/28/20 10:00 AM**	**5/5/20 5:00 PM**		
15		UI Mockups	0.75 days	4/28/20 10:00 AM	4/28/20 5:00 PM	10	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
16		Sequence Diagrams	0.5 days?	4/29/20 10:00 AM	4/29/20 3:00 PM	18	Bengi[50%];Gürbüz[50%]
17		Use Case Diagrams	0.5 days?	4/29/20 8:00 AM	4/29/20 1:00 PM	10;15	Evren[50%];Turaç[50%]
18		Class Diagrams	1 day?	4/28/20 10:00 AM	4/29/20 10:00 AM	10	Evren
19		Github commit structure	2 days	4/29/20 8:00 AM	4/30/20 5:00 PM	4	Gürbüz
20		Jenkins implementation	3 days	5/1/20 8:00 AM	5/5/20 5:00 PM	4;19	Gürbüz
21		System design document - wiki update	0 days	5/5/20 5:00 PM	5/5/20 5:00 PM	20	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
23		**City Model & Features**	**6.25 days?**	**4/29/20 3:00 PM**	**5/7/20 5:00 PM**		
24		City creation front-end development	4 days?	4/29/20 3:00 PM	5/5/20 3:00 PM	16;18	Turaç
25		Repo ready for development and documenta...	3 days?	4/29/20 3:00 PM	5/4/20 3:00 PM	16;18	Turaç
26		City features testing	1 day?	5/5/20 3:00 PM	5/6/20 3:00 PM	24;25	Turaç
27		City deployed	0 days?	5/6/20 3:00 PM	5/6/20 3:00 PM	26	Turaç
		Requirements brainstorming & question					
29		Post & Comment	**6.25 days?**	**4/29/20 3:00 PM**	**5/7/20 5:00 PM**		
30		Post audio feature front-end integration	2 days?	4/29/20 3:00 PM	5/1/20 3:00 PM	16;18	Bengi
31		Post location feature front-end integration	2 days?	4/29/20 3:00 PM	5/1/20 3:00 PM	16;18	Bengi
32		Comment feature front-end integration	2 days?	5/1/20 3:00 PM	5/5/20 3:00 PM	30;31	Turaç
33		Post back-end development	2 days?	4/29/20 3:00 PM	5/1/20 3:00 PM	16;18	Bengi[50%];Evren[50%]
34		Comment back-end development	1 day?	5/6/20 8:00 AM	5/6/20 5:00 PM	21	Turaç
35		Post Features Testing	0.5 days?	5/1/20 3:00 PM	5/4/20 10:00 AM	33	Bengi[50%];Evren[50%]
36		Comment Feature Testing	1 day?	5/7/20 8:00 AM	5/7/20 5:00 PM	34	Turaç
37		Post & Comment deployer	0 days?	5/7/20 5:00 PM	5/7/20 5:00 PM	36	Bengi[50%];Evren[50%]
39		Annotations	**13 days?**	**5/6/20 8:00 AM**	**5/22/20 5:00 PM**		
40		Class Diagrams	3 days?	5/6/20 8:00 AM	5/8/20 5:00 PM	21	Bengi
41		Annotations front-end development	7 days?	5/11/20 8:00 AM	5/19/20 5:00 PM	40	Bengi
42		Annotations feature testing	3 days?	5/20/20 8:00 AM	5/22/20 5:00 PM	40;41	Bengi
43		Annotations deployed	0 days?	5/22/20 5:00 PM	5/22/20 5:00 PM	42	Bengi
		System design document - wiki update					
45		**User & Login Structure**	**4 days?**	**5/6/20 8:00 AM**	**5/11/20 5:00 PM**		
46		City deployed	1 day?	5/6/20 8:00 AM	5/6/20 5:00 PM	21	Gürbüz
47		Login page front-end development	2 days?	5/7/20 8:00 AM	5/8/20 5:00 PM	46	Gürbüz
48		User & Login features testing	1 day?	5/11/20 8:00 AM	5/11/20 5:00 PM	46;47	Gürbüz
49		User & login deployed	1 day?	5/11/20 8:00 AM	5/11/20 5:00 PM	46;47	Gürbüz
51		**Subscriptions & Follow Feature**	**1.5 days?**	**5/12/20 8:00 AM**	**5/13/20 1:00 PM**		
52		Subscriptions backend development	0.5 days?	5/12/20 8:00 AM	5/12/20 1:00 PM	49	Evren[50%];Gürbüz[50%]
53		Subscriptions front-end development	0.5 days?	5/12/20 1:00 PM	5/12/20 5:00 PM	52	Evren[50%];Gürbüz[50%]
54		Feature Testing	0.5 days?	5/13/20 8:00 AM	5/13/20 1:00 PM	52;53	Evren[50%];Gürbüz[50%]
55		Subscriptions & Follow deployed	0 days?	5/13/20 1:00 PM	5/13/20 1:00 PM	54	Evren[50%];Gürbüz[50%]
57		**Activity Stream**	**9 days?**	**5/12/20 8:00 AM**	**5/22/20 5:00 PM**		
58		Activity Stream back-end development	5 days?	5/12/20 8:00 AM	5/18/20 5:00 PM	49	Evren
59		Activity Stream front-end development	1 day?	5/19/20 8:00 AM	5/19/20 5:00 PM	58	Evren[50%];Gürbüz[50%]
60		Activity stream feature testing	3 days?	5/20/20 8:00 AM	5/22/20 5:00 PM	59	Evren
61		Aactivity Stream deployed	0 days?	5/22/20 5:00 PM	5/22/20 5:00 PM	60	Evren
63		**Production Tests**	**8 days?**	**5/13/20 1:00 PM**	**5/25/20 1:00 PM**		
64		Web App features all integration tests	0.25 days?	5/13/20 1:00 PM	5/13/20 3:00 PM	55	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
65		Annotation Server tests	0.5 days?	5/25/20 8:00 AM	5/25/20 1:00 PM	42;64	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
66		Activity Stream tests	0.5 days?	5/25/20 8:00 AM	5/25/20 1:00 PM	61	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
67		All integration tests completed	0 days?	5/25/20 1:00 PM	5/25/20 1:00 PM	66	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
69			**1.25 days?**	**5/25/20 1:00 PM**	**5/26/20 3:00 PM**		
70		User backend development	1.25 days?	5/25/20 1:00 PM	5/26/20 3:00 PM	67	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
71		Annotation server on Production	0.75 days?	5/25/20 1:00 PM	5/26/20 10:00 AM	67	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
72		Activity Stream on production	0.75 days?	5/25/20 1:00 PM	5/26/20 10:00 AM	67	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
73		All functional web app	0 days?	5/26/20 10:00 AM	5/26/20 10:00 AM	72	Bengi[25%];Evren[25%];Gürbüz[25%];Turaç[2...
